

## ایجاد فعالیت LOE در نرم افزار MSP

فرض کنید می خواهید فعالیت "بازرسی جوش" را در برنامه زمانبندی زیر به فعالیت LOE تبدیل کنید:

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
				25 بهمن 94'
				02 اسفند 94'
1	بازرسی جوش	?day ۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۹
2	فیت آپ	days ۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۱۳۹۴/۱۱/۳۰
3	جوشکاری	days ۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۳
4	تاچ آپ	days ۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۵
5	تست	day ۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۶

برای ایجاد فعالیت LOE در MSP به ترتیب زیر عمل کنید:

- 1- تاریخ Start اولین فعالیتی که فرار است زیر مجموعه "بازرسی جوش" در نظر گرفته شود (در این مثال فعالیت فیت آپ) را کپی کنید و در تاریخ start "بازرسی جوش" Paste Special از نوع Paste link را انجام دهید:

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
				B Koodak 11
				B I A
				Cut Cell
				Copy Cell
				Paste
				Paste Special...

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
				B Koodak 11
				B I A
				Cut Cell
				Copy Cell
				Paste
				Paste Special...
				Scroll to Task
				Insert Task

**Paste Special**

Source: Q:\project site\loe in

As:

Paste:  
 Paste Link:

Display As Icon

Result


Inserts the contents of the Clipboard into your document as Text Data. Paste Link creates a link to the source file so that changes to the source file will be reflected in your document.

OK Cancel

2- همین عملیات را برای تاریخ **Finish** آخرین فعالیتی که قرار است زیر مجموعه "بازرسی جوش" در نظر گرفته شود (در این مثال فعالیت تست) تکرار کرده و در تاریخ **Finish** "بازرسی جوش" Paste Special از نوع Paste link را انجام دهید:

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
	بازرسی جوش	?day 1	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	
	فیت آپ	days ۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	
	جوشکاری	days ۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	
	تاچ آپ	days ۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	
	تست	day 1	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
	بازرسی جوش	?day 1	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	
	فیت آپ	days ۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	
	جوشکاری	days ۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	
	تاچ آپ	days ۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	
	تست	day 1	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	

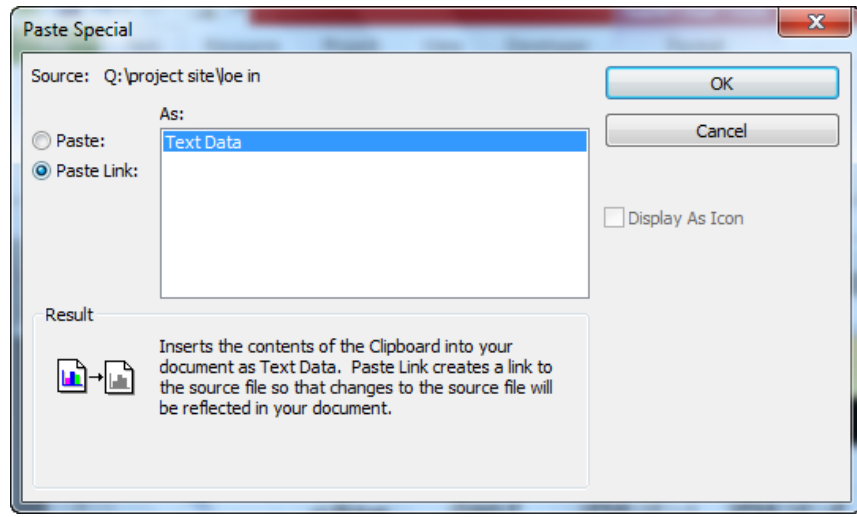

3- نتیجه بصورت زیر خواهد شد:

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
	بازرسی جوش	?days ۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	
	فیت آپ	days ۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	
	جوشکاری	days ۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۲
	تاچ آپ	days ۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۳
	تست	day 1	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۴

در صورت وجود علامت سوال در Duration فعالیت LOE، با دبل کلیک بر روی آن در پنجره باز شده تیک Estimated را غیر فعال کنید:

The image shows a 'Task Information' dialog box with several tabs: General, Predecessors, Resources, Advanced, Notes, and Custom Fields. The 'General' tab is active. The 'Name' field contains 'بازرسی جوش'. The 'Duration' is set to '8d'. The 'Estimated' checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'Priority' is set to '500'. The 'Schedule Mode' has 'Manually Scheduled' and 'Auto Scheduled' options, with 'Auto Scheduled' selected. The 'Dates' section shows 'Start' as '1394/11/29' and 'Finish' as '1394/12/06'. There are also checkboxes for 'Display on Timeline', 'Hide Bar', and 'Rollup'. At the bottom, there are 'Help', 'OK', and 'Cancel' buttons.

**نکته:** فعالیتی که قرار است به عنوان LOE در نرم افزار MSP ایجاد شود باید بدون پیش نیاز و پس نیاز باشد.
